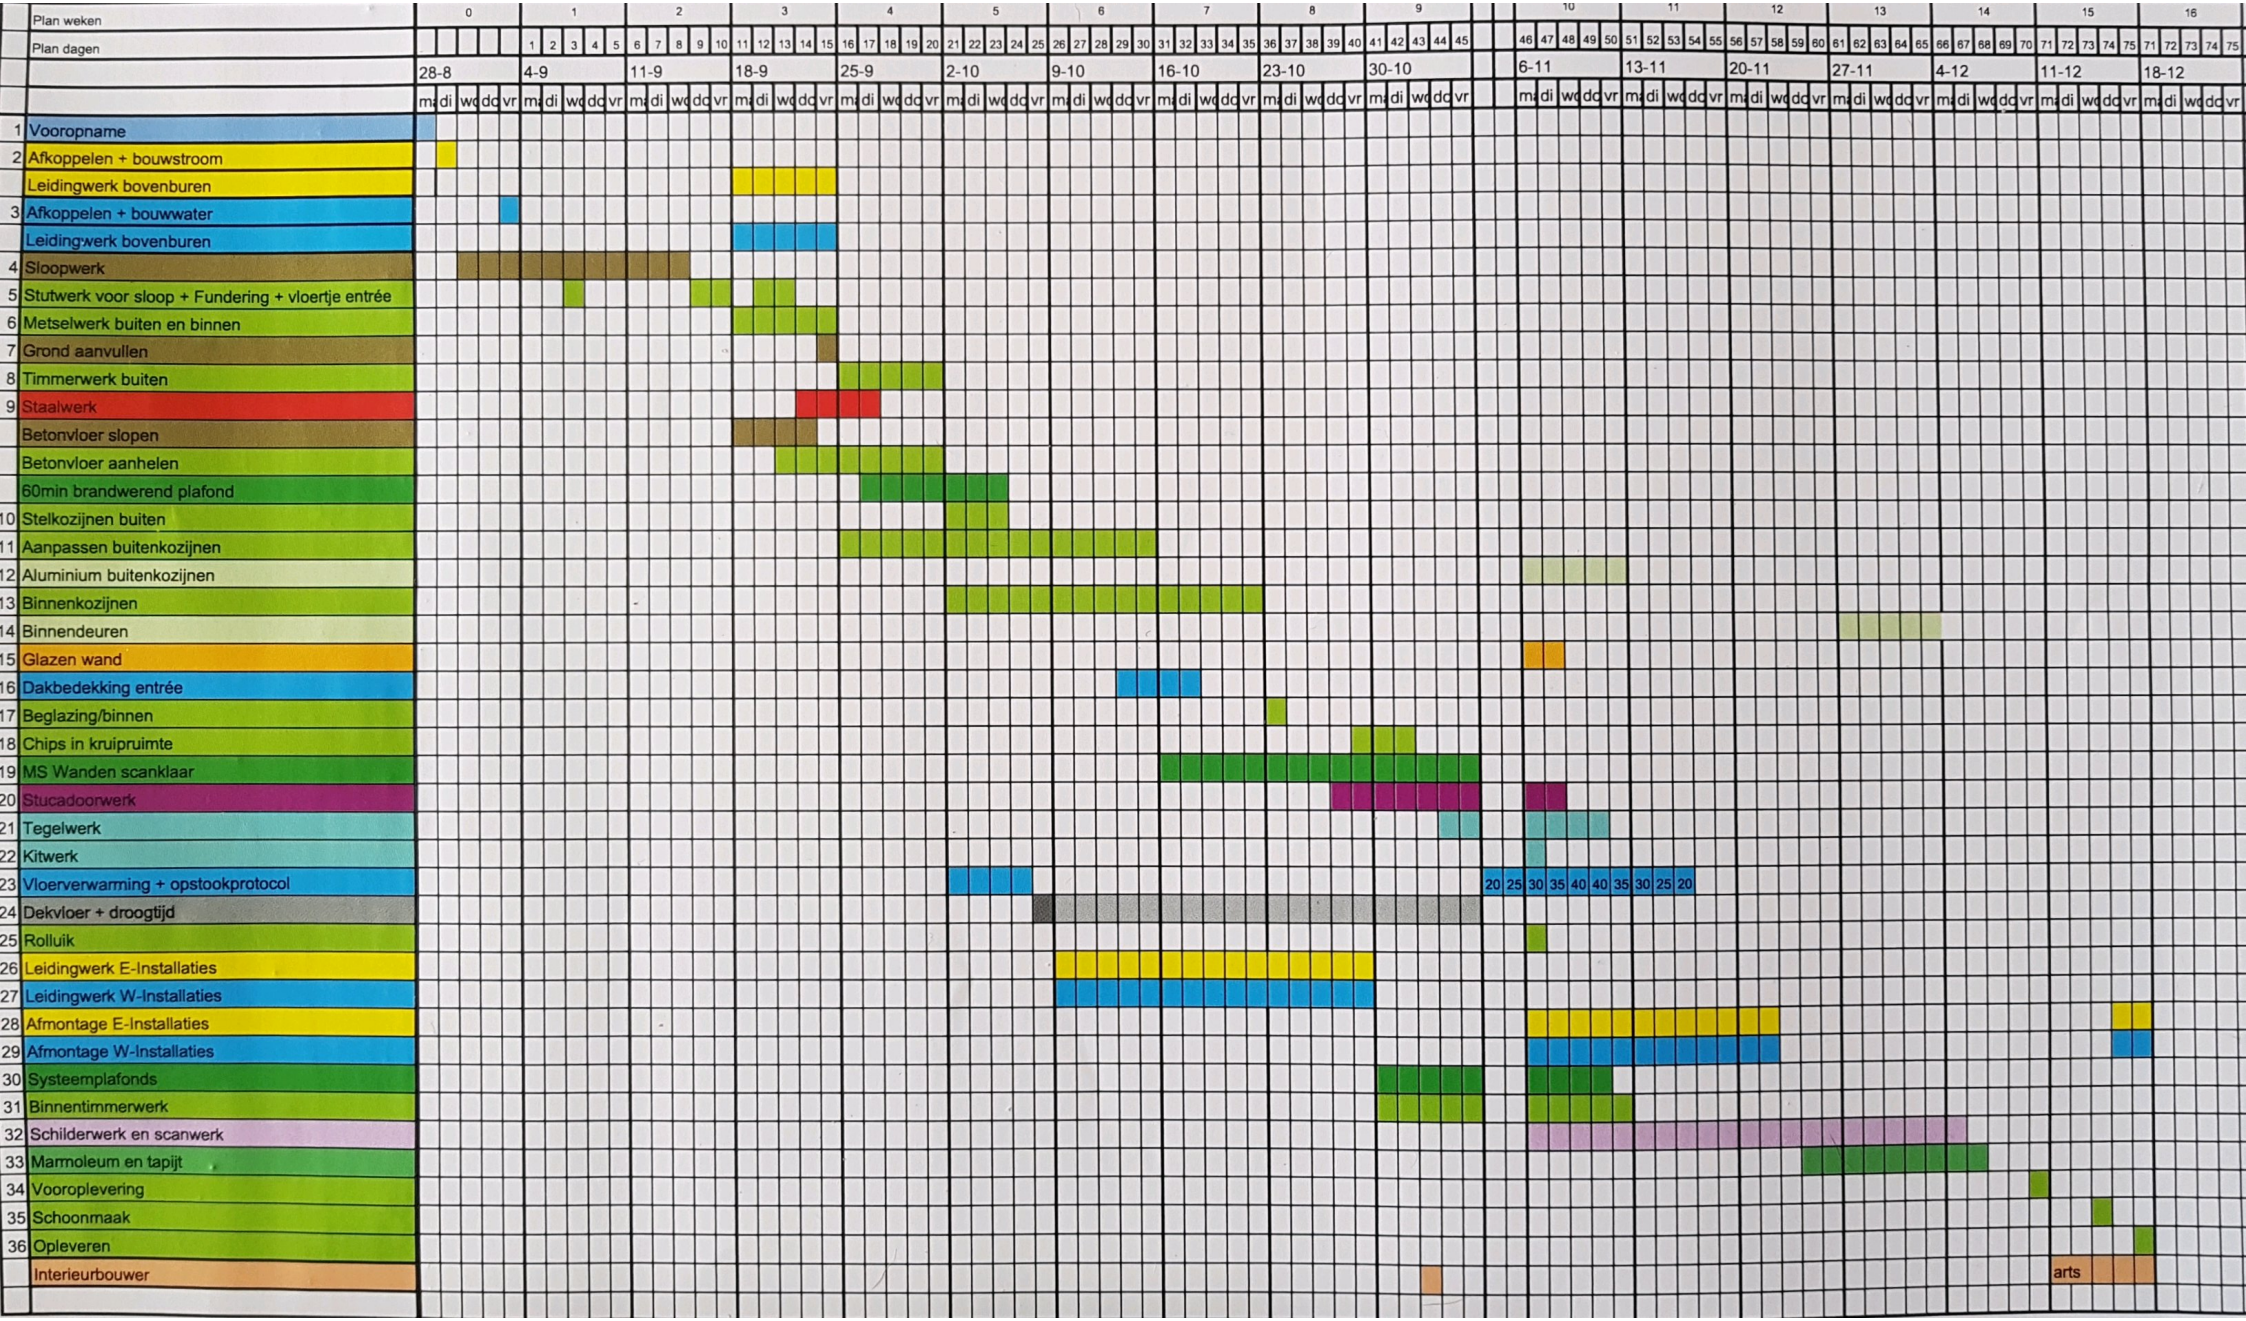
Plan weken
Plan dagen
28-8
4-9
11-9
18-9
25-9
2-10
9-10
16-10
23-10
30-10
6-11
13-11
20-11
27-11
4-12
11-12
18-12
1 Vooropname
2 Afkoppelen + bouwstroom
Leidingwerk bovenburen
3 Afkoppelen + bouwwater
Leidingwerk bovenburen
4 Sloopwerk
5 Stutwerk voor sloop + Fundering + vloertje entrée
6 Metselwerk buiten en binnen
7 Grond aanvullen
8 Timmerwerk buiten
9 Staalwerk
Betonvloer slopen
Betonvloer aanhelen
60min brandwerend plafond
10 Stelkozijnen buiten
11 Aanpassen buitenkozijnen
12 Aluminium buitenkozijnen
13 Binnenkozijnen
14 Binnendeuren
15 Glazen wand
16 Dakbedekking entrée
17 Beglazing/binnen
18 Chips in kruipruimte
19 MS Wanden scanklaar
20 Stucadoorwerk
21 Tegelwerk
22 Kitwerk
23 Vloerverwarming + opstookprotocol
20 25 30 35 40 40 35 30 25 20
24 Dekvloer + droogtijd
25 Rolluik
26 Leidingwerk E-Installaties
27 Leidingwerk W-Installaties
28 Afmontage E-Installaties
29 Afmontage W-Installaties
30 Systeemplafonds
31 Binnentimmerwerk
32 Schilderwerk en scanwerk
33 Marmoleum en tapijt
34 Vooroplevering
35 Schoonmaak
36 Opleveren
Interieurbouwer
arts
